

○○사업 품질점검단 품질점검 결과

점검일 : 2025. 6. 13.(금)

□ 지적사항




맨홀 돌출구조물 높이 재조정



안전을 위해 관목밀식으로 횡단이
어렵도록 처리

□ 권장사항

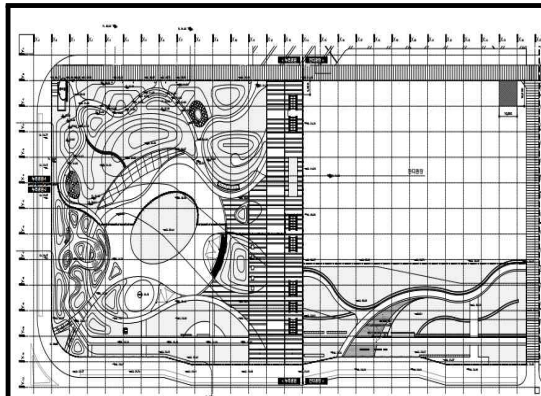

잔디층구처리로 토사유출 예방



돌의 모양을 잘 파악한 배석으로 경관
향상에 기여, 주변에 초화류나 관목 처리

스탠드 부분



열린마당 추후 이벤트를 고려하여
스탠드로 검토
